



المشاريع

فك العزلة وتأهيل البنيات الطرقية وتهيئة المسالك

01

المحور الاستراتيجي

يتضمن هذا المحور 13 مشروعا ويشمل:

- تاهيل وتقوية الطرق والمسالك
- بناء المنشآت الفنية والمعابر
 - اعداد الدراسات
- اقتناء آليات تهيئة المسالك وبناء الطرق

فك العزلة وتأهيل البنيات الطرقية وتهيئة المسالك

المحور الأول : انجاز المسالك فى إطار برنامج 20 يوم لكل جماعة

الرقم	الجماعة	الطول الإجمالي المقترح انجازه (كلم)	الطول المنجز (كلم)
1	تفتشنا	39	11
2	تمكروت	12.7	16.9
3	فزواطة	15.5	12.85
4	النقوب	47	41.5
5	ايت ولال	16	11.8
6	كتاوة	103	24.1
7	تزارين	41	16.1
8	تاكونيت	32,7	11,30
9	ايت بوداود	7,70	12,80
10	المحاميد	46,40	
11	تغبالت	20	فى طور حصر الوضعية
12	تمزموط	16	
13	الروحا	66	الاشغال مستمرة
	المجموع	463	158,35

المحور الثاني :

تدخلات آليات المجلس الإقليمي من اجل فتح الطرق بالإقليم خلال التساقطات المطرية لشهر شتنبر 2024

التاريخ	نوع التدخل	المقطع الطرقي
من 09 الى 16 شتنبر	اصلاح الأجزاء المتضررة فتح الطريق امام المارة	الطريق الوطنية رقم 09
من 10 الى 23 شتنبر	اصلاح الأجزاء المتضررة فتح الطريق امام المارة	الطريق الوطنية رقم 17
من 22 الى 24 شتنبر	اصلاح الأجزاء المتضررة فتح الطريق امام المارة	الطرق غير المصنفة

فك العزلة وتأهيل البنيات الطرقية وتهيئة المسالك صور المشاريع



حماية البيئة وحفظ الصحة وتأمين التراث وتأهيل المراكز

02

المحور الاستراتيجي

- يتضمن هذا المحور 34 مشروعاً يشمل:
- إعادة استعمال المياه العادمة
 - تهيئة الفضاعات الخضراء
 - بناء وتجهيز مكاتب حفظ الصحة
 - الحماية من الحرائق والفياضانات وزحف الرمال
 - تاهيل المراكز
 - دعم المرافق الثقافية وتأمين التراث

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية



موقع المشروع	اكذز
موضوع المشروع	أشغال بناء مكتب حفظ الصحة للتجمع الجماعي كيسان بمركز مدينة اكذز عمالة زاكورة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 4 948 739,49
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - عمالة اقليم زاكورة - المجلس الإقليمي - م ج ك - جماعات: اكذز-افلاندر-تانسيقت- مزكيطة تمزموط
مدة الانجاز	شهرًا 12
نسبة الانجاز	90%

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية



موقع المشروع	تزارين
موضوع المشروع	أشغال بناء مكتب حفظ الصحة للتجمع الجماعي صاغرو بمركز تزارين عمالة زاكورة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 5 547 601,08
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - عمالة إقليم زاكورة - المجلس الإقليمي - م ج ل ص - جماعات: النقوب-تفتشنا-ايت ولال-تزارين-ايت بوداود - تغبالت
مدة الانجاز	شهر 12
نسبة الانجاز	100%

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية



موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال إحداث الحزام الأخضر بمدينة زاكورة الحصة : بناء أبراج المراقبة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
تكلفة المشروع	درهم 300 064,80
الشركاء	تمويل ذاتي
مدة الانجاز	شهور 04
نسبة الانجاز	100%

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية




موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال إحداث الحزام الأخضر بمدينة زاكورة الحصة. حصة الكهرباء
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
تكلفة المشروع	231 483,72 درهم
الشركاء	تمويل ذاتي
مدة الانجاز	شهور 04
نسبة الانجاز	100%

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية



زاكورة	موقع المشروع
أشغال صيانة الحزام الأخضر بمدينة زاكورة	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 1 741 184,10	كلفة المشروع
المديرية العامة للجماعات الترابية - عمالة إقليم زاكورة - المجلس الاقليمي	الشركاء
على مدى 03 سنوات	مدة الانجاز
في طور الانجاز	نسبة الانجاز

حماية البيئة وحفظ الصحة وتثمين التراث وتأهيل المراكز بطاقة تقنية



تمكروت	موقع المشروع
اقتناء وتركيب فرن بغاز البوتان لفائدة الحرفيين بقرية الفخار بتمكروت.-الحصة الأولى	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 475 800,00	كلفة المشروع
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- المجلس الاقليمي- تعاونية الفخار بتمكروت-	الشركاء
أشهر 04	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز

تقوية ولوج الساكنة القروية بالأقليم للماء الشروب والكهرباء

03

المحور الاستراتيجي

- يتضمن هذا المحور 11 مشروعا يشمل:
- التزود بالماء الشروب
 - الربط بالكهرباء والنجاعة الطاقية
 - انجاز الدراسات

تقوية ولوج الساكنة القروية بالاقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



امحاميد الغزلان	موقع المشروع
أشغال انجاز عتبة التطعيم الاصطناعي بجماعة امحاميد الغزلان	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 7 022 952,00	كلفة المشروع
وكالة - - ANDZOA - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة الحوض المائي درعة واد نون	الشركاء
شهرًا 11	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز

تقوية ولوج الساكنة القروية بالاقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



موقع المشروع	تغالت
موضوع المشروع	أشغال انجاز عتبة التطعيم الاصطناعي بجماعة تغالت
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 5 809 221,60
الشركاء	- - ANDZOA - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة وكالة الحوض المائي كير زيز غريس
مدة الانجاز	أشهر 10
نسبة الانجاز	في طور الانجاز

تقوية ولوج الساكنة القروية بالأقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



موقع المشروع	جماعة تنزولين
موضوع المشروع	اشغال تزويد مركز تنزولين ودوار الحدان بالماء الصالح للشرب
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 3 661 847,76
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة
مدة الانجاز	أشهر 09
نسبة الانجاز	100%

تقوية ولوج الساكنة القروية بالاقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



ترناتة	موقع المشروع
أشغال تزويد مركز جماعة ترناتة بالماء الصالح للشرب	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 5 000 000,00	كلفة المشروع
المديرية العامة للجماعات الترابية - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة	الشركاء
اشهر 09	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز


تقوية ولوج الساكنة القروية بالأقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



موقع المشروع	فzواطة
موضوع المشروع	ربط الماء الصالح للشرب بمحطة التنقية بتامكروت في اتجاه الخزائين 250 و 75 متر مكعب مع امكانية تزويد الخزائين بالماء الصالح للشرب من سد اكدز بجماعة فزواطة عمالة زاكورة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 2 664 299,40
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة
مدة الانجاز	أشهر 05
نسبة الانجاز	100%

تقوية ولوج الساكنة القروية بالاقليم للماء الشروب والكهرباء

بطاقة تقنية

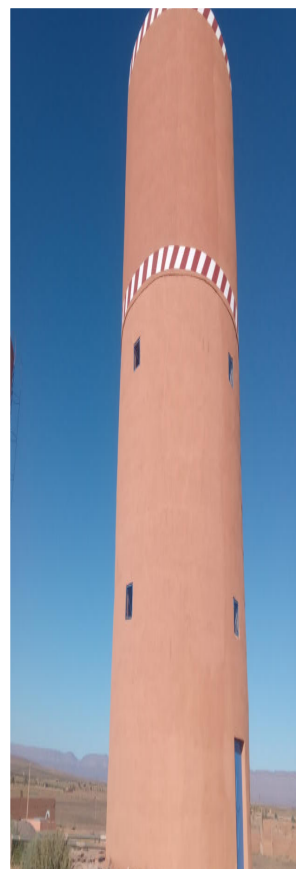

الروحا	موقع المشروع
أشغال تزويد خمس دواوير بالماء الصالح للشرب:بوخلال، تمجوط، اولاد بوزيد، اولاد الحاج والمنصورية	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 3 946 083,62	كلفة المشروع
المديرية العامة للجماعات الترابية - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة	الشركاء
شهر 12	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز

تقوية ولوج الساكنة القروية بالاقليم للماء الشروب والكهرباء بطاقة تقنية



موقع المشروع	بني زولي
موضوع المشروع	أشغال تزويد مركز جماعة بني زولي بالماء الصالح للشرب
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 3 769 025,04
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة
مدة الانجاز	أشهر 08
نسبة الاتجاز	50%

تعزيز الاسطول وحكامة النقل المدرسي

04

المحور الاستراتيجي

يتضمن هذا المحور 06 مشاريع ويشمل:

- اقتناء الحافلات
- اقتناء الإطارات المطاطية وقطع الغيار
 - التكوين وتقوية القدرات
 - حكامة التدبير

تعزير الاسطول وحكامة النقل المدرسي بطاقة تقنية



موقع المشروع	جماعة بالاقليم 23
موضوع المشروع	اقتناء سيارات النقل المدرسي
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 12 700 000,00
الشركاء	جهة درعة تافيلالت – عمالة الإقليم - الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – المجلس الاقليمي
مدة الانجاز	اشهر 06
نسبة الانجاز	100%

تعزير الاسطول وحكامة النقل المدرسي بطاقة تقنية



موقع المشروع	جماعة بالاقليم 23
موضوع المشروع	اقتناء الإطارات المطاطية وقطع الغيار
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 1 500 000,00
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية
مدة الانجاز	تغطية حاجيات سنتين
نسبة الانجاز	100%

تعزير الاسطول وحكامه النقل المدرسي بطاقة تقنية

موقع المشروع

إقليم زاكورة

موضوع المشروع

تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفدراليات المسيرة للنقل المدرسي

حامل المشروع

المجلس الإقليمي لزاكورة



تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة


05

المحور الاستراتيجي

- يتضمن هذا المحور 41 مشروع ويشمل:
- تطوير العرض الصحي وتحسين الولوج للخدمات الصحية
 - احداث وتأهيل المرافق
 - تاهيل المؤسسات التعليمية ودعم التميز المدرسي

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية

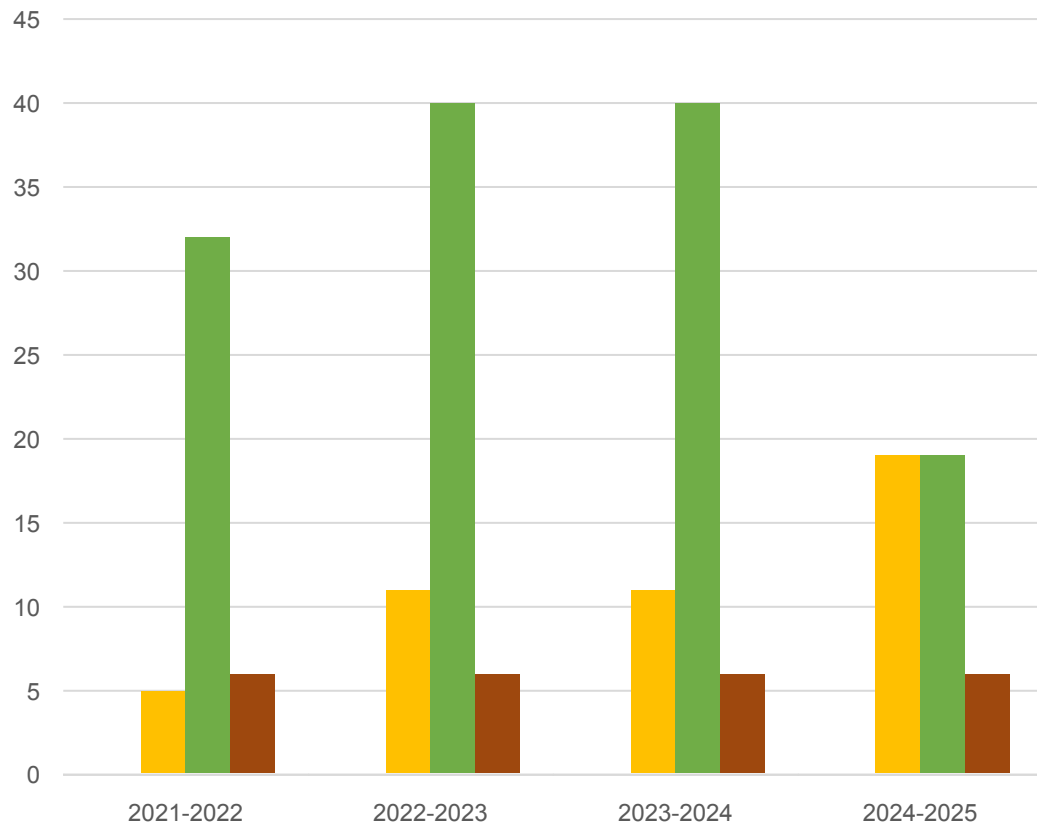

موقع المشروع	إقليم زاكورة	
موضوع المشروع	تقوية المستشفى الإقليمي والمؤسسات الصحية بالموارد البشرية في إطار التشغيل بالنيابة	
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة	
تكلفة المشروع	2021 - 2022	3 926 246,40
	2022 -2023	6 662 880,00
	2023 - 2024	6 896 448,00
	2024 - 2025	6 870 240,00
الشركاء	وزارة الصحة – عمالة إقليم زاكورة - جهة درعة تافيلات – المجلس الإقليمي- الجماعات الترابية	
نسبة الانجاز	في طور الانجاز	

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة


بطاقة تقنية



موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال توسعة وتهيئة المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة (الحصة 01: البناء))
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 18 244 135,03
الشركاء	جهة درعة تافيلالت – – ANDZOA – وزارة الصحة عمالة إقليم زاكورة – المجلس الاقليمي
مدة الانجاز	شهر 17
نسبة الانجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية

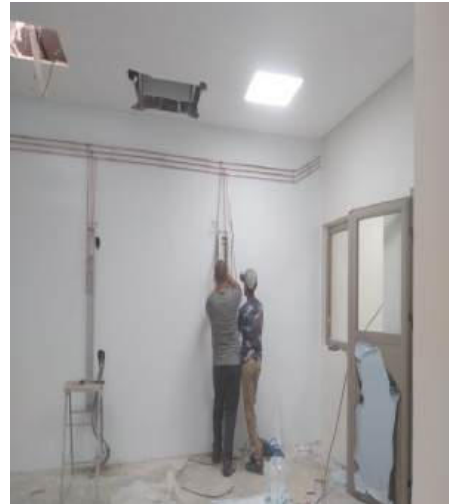

زاكورة	موقع المشروع
أشغال توسعة وتهيئة المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة الوحدة 02: السوائل الطبية))	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 1 912 144,17	تكلفة المشروع
جهة درعة تافيلالت - - ANDZOA - وزارة الصحة عمالة إقليم زاكورة - المجلس الإقليمي	الشركاء
أشهر 04	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز


تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة بطاقة تقنية



موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال توسعة وتهيئة المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة الحصة 3 : التكييف الهوائي، الدخان، معالجة الهواء))
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 4 130 018,64
الشركاء	جهة درعة تافيلالت – – ANDZOA – وزارة الصحة عمالة إقليم زاكورة – المجلس الاقليمي
مدة الانجاز	أشهر 04
نسبة الانجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية

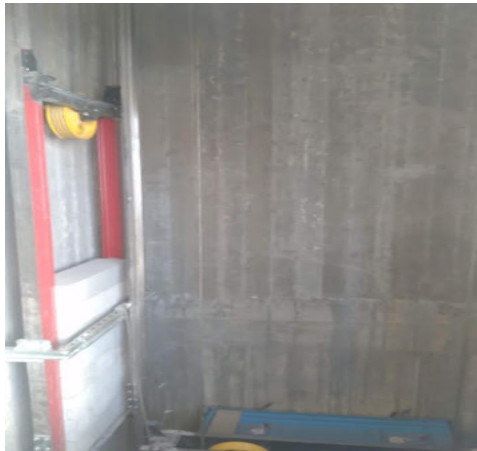

موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال توسعة وتهيئة المركز الإستشفائي الإقليمي لزاكورة عمالة زاكورة. (الحصّة 4 : أشغال تركيب مصاعد البضائع والمرضى)
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 1 128 962,40
الشركاء	جهة درعة تافيلالت – – ANDZOA – وزارة الصحة عمالة إقليم زاكورة – المجلس الاقليمي
مدة الانجاز	أشهر 03
نسبة الانجاز	100%



تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية



موقع المشروع	تاكونيت - كتاوة
موضوع المشروع	أشغال بناء أسوار ومرافق صحية بمدارس الجماعات الترابية: تاكونيت - كتاوة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 682 605,16
الشركاء	ANDZOA - الأكاديمية الجهوية للتعليم - جهة درعة تافيلالت المجلس الإقليمي - الجماعات
مدة الانجاز	شهور 06
نسبة الانجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة بطاقة تقنية

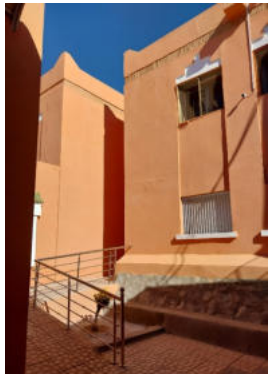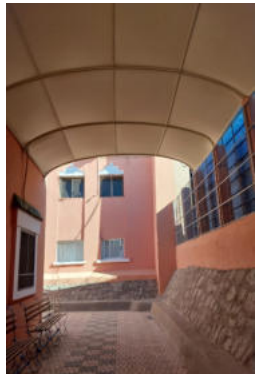

موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال تهيئة مصلحة الطب النفسي بمستشفى الدراق بجماعة زاكورة عمالة زاكورة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 609 787,89
الشركاء	وزارة الصحة – عمالة إقليم زاكورة – جهة درعة تافيلالت – المجلس الإقليمي – ANDZOA
مدة الانجاز	أشهر 04
نسبة الانجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة


بطاقة تقنية



موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	اشغال تهيئة ملحق للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في المستشفى الإقليمي لزاكورة
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
تكلفة المشروع	درهم 439 356,43
الشركاء	تمويل ذاتي
مدة الانجاز	شهور 07
نسبة الانجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية

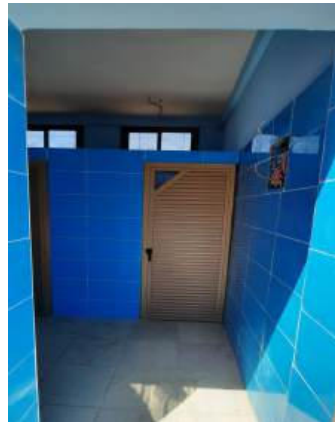

موقع المشروع	الروحا – بوزروال – بلدية - ترناتة
موضوع المشروع	أشغال بناء أسوار ومرافق صحية بمدارس الجماعات الترابي
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 1 074 908,78
الشركاء	الأكاديمية الجهوية للتعليم – جهة درعة تافيلالت – المجلس الإقليمي - الجماعات - ANDZOA
مدة الانجاز	شهور 06
نسبة الاتجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية



موقع المشروع	إقليم زاكورة
موضوع المشروع	اقتناء سيارات الاسعاف
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 3 999 000,00
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية – المجلس الإقليمي – عمالة إقليم زاكورة
مدة الانجاز	شهور 03
نسبة الاتجاز	100%

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة بطاقة تقنية



موقع المشروع	إقليم زاكورة
موضوع المشروع	دعم ومواكبة طلبة الإقليم لولوج المدارس والمعاهد العليا الوطنية والدولية
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 1 726 000,00
الشركاء	مجموعة - (INDH) المجلس الإقليمي - عمالة إقليم زاكورة مدارس كتيبة بريبا - جمعية درعة للتميز
مدة الانجاز	على مدى 03 سنوات
نسبة الانجاز	في طور الانجاز

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية



تمكروت - تانسيفت	موقع المشروع
أشغال تهيئة الأسواق الأسبوعية بمراكز الجماعات الترابية: تمكروت وتانسيفت	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 11 030 491,23	كلفة المشروع
عمالة إقليم زاكورة - المجلس الإقليمي - جماعات - DGCT تانسيفت وتمكروت	الشركاء
شهرًا 10	مدة الانجاز
95%	نسبة الانجاز

تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة

بطاقة تقنية



موقع المشروع	بني زولي
موضوع المشروع	أشغال تهيئة الأسواق الأسبوعية بمركز الجماعات جماعة بني زولي
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 5 000 000,00
الشركاء	وزارة الداخلية عمالة إقليم زاكورة المجلس الإقليمي جماعة بني زولي
مدة الانجاز	أشهر 06
نسبة الانجاز	100%


التسويق الترابي وتقوية القدرات المؤسسية للمجلس الإقليمي

06

المحور الاستراتيجي

- يتضمن هذا المحور 10 مشاريع تتمحور حول :
- تقوية عوامل وآليات التسويق الترابي
 - تعزيز الرصيد العقاري
 - تأهيل الموارد البشرية وتجويد المرافق الادارية

التسويق الترابي وتقوية القدرات المؤسسية للمجلس الاقليمي بطاقة تقنية

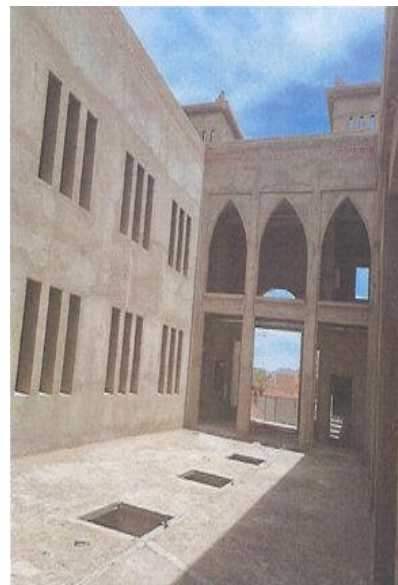

موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال بناء مقر المجلس الإقليمي لزاكورة - إقليم زاكورة - الحصّة الاولى
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 8 330 975,09
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية - عمالة إقليم زاكورة - المجلس الإقليمي
مدة الانجاز	شهرًا 12
نسبة الانجاز	100%

التسويق الترابي وتقوية القدرات المؤسسية للمجلس الاقليمي بطاقة تقنية




موقع المشروع	زاكورة
موضوع المشروع	أشغال بناء مقر المجلس الإقليمي لزاكورة – إقليم زاكورة- الحصة الثانية: (التكملة)
حامل المشروع	المجلس الإقليمي لزاكورة
كلفة المشروع	درهم 6 810 372,00
الشركاء	المديرية العامة للجماعات الترابية – عمالة إقليم زاكورة – المجلس الاقليمي
مدة الانجاز	شهور 10
نسبة الانجاز	100%

التسويق الترابي وتقوية القدرات المؤسسية للمجلس الاقليمي بطاقة تقنية



إقليم زاكورة	موقع المشروع
تجهيز مقر المجلس الإقليمي اقليم زاكورة	موضوع المشروع
المجلس الإقليمي لزاكورة	حامل المشروع
درهم 4 785 024,48	كلفة المشروع
المديرية العامة للجماعات الترابية – عمالة إقليم زاكورة – المجلس الاقليمي	الشركاء
شهور 06	مدة الانجاز
100%	نسبة الانجاز

المشاريع المنجزة حسب الأهداف الاستراتيجية

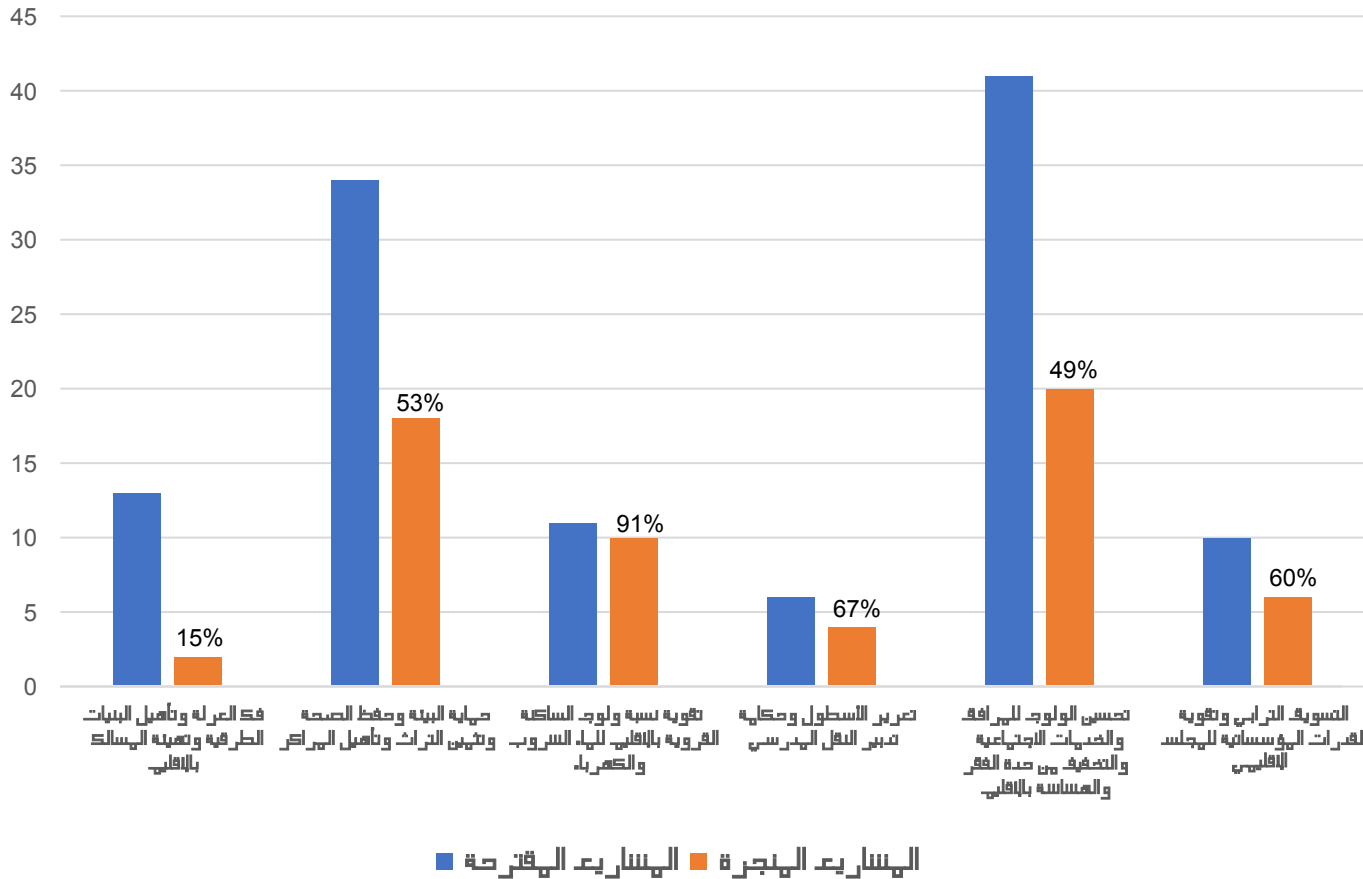

الأهداف الاستراتيجية	المشاريع	المنجزة
فك العزلة وتأهيل البنيات الطرقية وتهيئة المسالك بالإقليم	13	02
حماية البيئة وحفظ الصحة وتمتين التراث وتأهيل المراكز	34	18
توفير نسبة ولوج الساكنة القروية بالإقليم للماء الشروب والكهرباء	11	10
تعزيز الأسطول وحكامة تدبير النقل المدرسي	06	04
تحسين الولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والهشاشة بالإقليم	41	20
تصوير الترابي وتقوية القدرات المؤسساتية للمجلس الإقليمي	10	06
المجموع	115	60
